

ORIGINAL

**NOMBRE DEL OFERENTE: MOISES MIGUEL AVILA MEJIA**

**SELLO**

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:**

---

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

Ayuntamiento Municipal Hato Mayor

Referencia: **AMHMR-CCC-CP-2023-0001**

Dirección: Carretera Hato Mayor-Sabana De La mar, Km.1

Teléfono: 829 (553-3776)

Correo Electrónico: [alcaldiahatomayordelrey@gmail.com](mailto:alcaldiahatomayordelrey@gmail.com)

**DOCUMENTACION TECNICA SOBRE A**

SNCC.F.034



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR

No. EXPEDIENTE

AMHMR-CCC-CP-2023-0001

18 de enero de 2023

Página 1 de 2

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores:  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR DEL REY

Yo Moisés Miguel Ávila Mejía, declaro que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia **AMHMR-CCC-CP-2023-0001**, incluyendo las enmiendas y adendas realizadas a los mismos:

- a) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

**LOTE # 1**

**LOTE # 2**

**LOTE # 4**


- b) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- c) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

- d) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
  
- e) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
  
- f) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

MOISES MIGUEL AVILA MEJIA en calidad de OFERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de MOISES MIGUEL AVILA MEJIA.

Firma

Sello



SNCC.F.042



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR

No. EXPEDIENTE

AMHMR-CCC-CP-2023-0001

Página 1 de 1

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE  
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha: 18 DE ENERO DEL AÑO 2023

1. Nombre/ Razón Social del Oferente MOISES MIGUEL AVILA MEJIA
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 027-0045921-3
4. RPE del Oferente: 52632
5. Domicilio legal del Oferente: C/ Padre Meriño #105 /sector Galindo Hato Mayor del Rey, Rep. Dom.
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: MOISES MIGUEL AVILA MEJIA Dirección: C/ Padre Meriño #105 /sector Galindo Hato Mayor del Rey, Rep. Dom. Números de teléfono y fax: (829) 638-3845 Dirección de correo electrónico: arq.moisesavila@gmail.com



# Arq. Moisés Miguel Ávila Mejía

Tels.:(829) 638-3845

E-mail: [arq.moisesavila@gmail.com](mailto:arq.moisesavila@gmail.com)

CODIA: 31624

Miércoles 18 de enero del año 2023  
San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

Señores:

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REL

**Asunto** : CARTA DE EVIDENCIA DE DOMICILIO Y RESIDENCIA

**Referencia** : AMHMR-CCC-CP-2023-0001

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente, quien le suscribe **ARQ. MOISES MIGUEL AVILA MEJIA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO.027-0045921-3** declaro y doy fe, de que mi domicilio y residencia principal están ubicado en la calle arzobispo Meriño # 105 del Sector Galindo en la Provincia Hato Mayor del Rey Rep.Dom.

Atentamente,

Arq. Moisés Miguel Ávila Mejía

Oferente

CODIA 31624



REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

027-0045921-3



LUGAR DE NACIMIENTO:  
HATO MAYOR, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:  
02 JULIO 1990

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: **M** SANGRE: **O+** ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

OCUPACIÓN: **ARQUITECTO (A)**

FECHA DE EXPIRACIÓN:  
02 JULIO 2024

moisesmiguelavilamejia moisesmiguelavilamejia moisesmiguelavilamejia

**MOISES MIGUEL  
AVILA MEJIA**







## Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

**RPE: 52632**

**Fecha de registro:** 21/4/2015

**Razón social:** MOISES MIGUEL AVILA MEJIA

**Género:** Masculino

**Certificación MIPYME:** No

**Clasificación empresa:**

**Ocupación:** INGENIERO CIVIL

**Domicilio:** C/ 27 DE FEBRERO NO. 20, HATO MAYOR DEL REY, ,

- REPÚBLICA DOMINICANA

**Persona de contacto:** MOISES MIGUEL AVILA MEJIA

**Fecha actualización:** 21/4/2015

**No. Documento:** 02700459213 - Cédula

**Provee:** Obras

**Registro de beneficiario:** No

**Estado:** Activo

**Motivo:**

**Observaciones:**

### Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30120000	Carreteras y paisaje
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
52100000	Revestimientos de suelos
71100000	Servicios de minería
71110000	Servicios de perforación y prospección petrolífera y de gas
71120000	Servicios de construcción y perforación de pozos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
73120000	Industrias del metal y de minerales
81100000	Servicios profesionales de ingeniería



**HACIENDA**



**Dirección General  
Controlaciones Públicas**

Portal Transaccional - 18/1/2023 10:02:55 a.m.





República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC: 4-01-50625-4  
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0223950190222**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **MOISES MIGUEL AVILA MEJIA**, RNC No. **02700459213**, con su domicilio y asiento fiscal en **HATO MAYOR DEL REY**, Administración Local **ADM LOCAL HATO MAYOR**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

- **IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.**

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **dieciocho (18) días del mes de enero del año dos mil veintitres (2023)**.

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: Z1SF-F47D-D9E1-6740-5908-0066 sha1: vWzK7uA6URCCysbqIAZgULFaBwUz DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 Z1SF-F47D-D9E1-6740-5908-0066

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



**Impuestos  
Internos**



**República Dominicana  
Ministerio de Hacienda**

### CERTIFICACIÓN DE REGISTRO

**Núm.: C0420230483359**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que **MOISES MIGUEL AVILA MEJIA**, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. **02700459213** está inscrito con las siguientes informaciones:

**DIRECCIÓN:** CALLE 27 DE FEBRERO, NO. 20, DEL SECTOR EL CENTRO, SECCION DE LA CIUDAD DE HATO MAYOR DEL REY.

**CONDICIÓN:** CONTRIBUYENTE

**ESTADO:** ACTIVO

**ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S):** ARQUITECTOS

**RÉGIMEN DE PAGO:** ORDINARIO

**PATRIMONIO / OCUPACION:** NO DISPONIBLE

**CATEGORÍA(S):** NO DISPONIBLE

La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha. La misma no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las informaciones declaradas, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los dieciocho (18) días del mes de enero del año dos mil veintitres (2023).

	<p>Código de firma: S1E9-3B93-N8N1-6740-5930-9956          sha1: nRQDDH2I7P48UD/Cbx8rUnDskY=          DGII - OFICINA VIRTUAL          DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</p>
	<p>S1E9-3B93-N8N1-6740-5930-9956</p>

La Certificación de Registro es un documento que presenta las principales informaciones de registro de contribuyentes y registrados, tal cual se encuentran en nuestros sistemas de información tributaria.

Condiciones de inscrito: (a) registrados y (b) contribuyentes.

(a) Realizan algún trámite, ciertas operaciones o efectúan declaración o pago de un impuesto o tasa ocasional.

(b) Desarrollan actividad(es) económica(s) que conlleva la presentación periódica de obligaciones tributarias.

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060.

## Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos  
 Av. México #48, Gascue, Santo Domingo República Dominicana,  
 C.P. 10204 RNC: 401-50625-4

T. 809-689-2181  
[dgii.gov.do](http://dgii.gov.do)





**Certificado de Registro Mercantil  
 Persona Física**

<b>REGISTRO NUEVO</b>		13/11/2020		Registro No.	144HM-PF		
<b>Nombres y Apellidos</b>		MOISES MIGUEL AVILA MEJIA				RPC:	027-0045921-3
<b>Nacionalidad</b>	REPÚBLICA DOMINICANA		<b>Cédula / Pasaporte</b>	027-0045921-3			
<b>Estado Civil</b>	Soltero(a)		<b>Profesión</b>	ARQUITECTO			
<b>Fecha Emisión</b>	11/11/2020		<b>Fecha Vencimiento</b>	11/11/2027			
<b>Dirección de la Residencia</b>							
<b>Calle</b>	HORACIO MARIA NUÑEZ, NO. 05			<b>Numero:</b>			
<b>Sector:</b>	CENTRO		<b>Ciudad/Municipio</b>	HATO MAYOR			
<b>Telefono 1</b>	(809) 553 3816		<b>Telefono 2</b>	(827) 638 3945		<b>Fax:</b>	
<b>Apartado Postal:</b>		<b>Email</b>	ARQ.MOISESAVILA@GMAIL.COM		<b>Web Site</b>		
<b>Nombre del establecimiento</b>		MOISES MIGUEL AVILA MEJIA					
<b>Dirección del Establecimiento</b>							
<b>Calle</b>	HORACIO MARIA NUÑEZ, NO. 05			<b>Numero:</b>			
<b>Sector:</b>	CENTRO		<b>Ciudad/Municipio</b>	HATO MAYOR			
<b>Telefono 1</b>	(827) 638 3945		<b>Telefono 2</b>	(809) 553 3816		<b>Fax:</b>	
<b>Apartado Postal</b>		<b>Email</b>	ARQ.MOISESAVILA@GMAIL.COM		<b>Web Site</b>		
<b>Actividad Descripción del Negocio</b>		<b>Principales Productos / Servicios</b>		<b>Sistema Armonizado (SA)</b>			
SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN GENERAL.		SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN GENERAL.					
<b>Actividad</b>	Sector Servicios Construcción, Sector Servicios Profesionales Arquitectos						
<b>Administradores y/o persona(s) autorizada(s) o firmar en su nombre</b>	<b>Dirección (Calle, Número, Sector)</b>		<b>Cédula / Pasaporte</b>	<b>País Origen/ Nacionalidad</b>	<b>Estado Civil</b>	<b>Profesión</b>	
MOISES MIGUEL AVILA MEJIA	HORACIO MARIA NUÑEZ, NO. 05 CENTRO, HATO MAYOR		027-0045921-3	REPÚBLICA DOMINICANA	Soltero(a)	ARQUITECTO	
<b>Capital General (Patrimonio) RD\$</b>	<b>Bienes Raíces RD\$</b>		<b>Fecha de Inicio de Operaciones</b>				
100.000.00			10/11/2020				
<b>Referencias Comerciales</b>			<b>Referencias Bancarias</b>				
<b>Dónde tiene Sucursales y Agencias?</b>							
<b>Numero de Empleados</b>	<b>Masculinos</b>		<b>Femeninos</b>		<b>Total:</b>		
<b>Nombre Comercial</b>	MOISES MIGUEL AVILA MEJIA						

**Wendi Marie Ayano**  
 Registradora Mercantil  
 Provincia Hato Mayor  
 Rep. Dom.

Registro no.

**0968-2023**



**MIPYMES**

## CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

MOISES MIGUEL AVILA MEJIA

**Clasificada como: MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA**

**CERTIFICAMOS:** Que la empresa MOISES MIGUEL AVILA MEJIA, PERSONA FISICA RNC No. 02700459213, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (3) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los (5) días del mes de Enero del año (2023).



93571





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR  
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: MOISES MIGUEL AVILA MEJIA

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
PARADOR FOTOGRAFICO LOS HATILLOS	SRD 2,200,000.	4 MESES	(JUNIO- SEPTIEMBRE 2022)	100%	AYUNTAMIENTO GUAYABO DULCE	(P) TITULAR PRINCIPAL	SI
CENTRO ODONTOLOGICO CEDENSA SRL	SRD 6,500,000.	3 AÑO	(DESDE MAYO 2020)	98,0%	CENTRO DENTAL CEDENSA	(P) TITULAR PRINCIPAL	SI

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Organos de Contratación correspondientes en adjuntos.

Firma

Sello

JUR 02 2014



SNCC.D.045



No. EXPEDIENTE  
AMHMR-CCC-CP-2023-0001

18 de enero de 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR

Página 1 de 3

## CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

**1. Cargo propuesto:** ARQUITECTO CONTRATISTA Y DIRECTOR DE OBRAS

---

**2. Nombre de la firma:** MOISES MIGUEL AVILA MEJIA

---

**3. Nombre del individuo:** MOISES MIGUEL AVILA MEJIA

---

**4. Fecha de nacimiento:** 02/07/1990      **Nacionalidad:** DOMINICANA

**5. Educación:** ESTUDIOS SUPERIORES

ARQUITECTURA  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)  
EGRESADO EN EL AÑO 2013  
SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM.

**6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:**

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA), HATO MAYOR DEL REY.

**7. Otras especialidades:**

HABILITACION DOCENTE, UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA, TECNICO EN FORMACION PROFESIONAL INFOTEP.

**8. Países donde tiene experiencia de trabajo:**

REPUBLICA DOMINICANA

**9. Idiomas:**

ESPAÑOL (BUENO), INGLÉS (BUENO), FRANCES (INICIAL)

**10. Historia Laboral:**

Desde [Año]: 2013


Hasta ACTUALIDAD

Cargos desempeñados: Arquitecto Contratista de Obras, Arquitecto Subcontratista de Obras, Arq. Supervisor de Obras.

<p><b>11. Detalle de las actividades asignadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-REPLANTEO DE OBRAS</li> <li>-EXCAVACIONES</li> <li>VACIADO DE CONTENES</li> <li>VACIADO DE ACERAS</li> <li>DESARROLLO DE PROYECTOS EN TODAS LAS AREAS</li> </ul>	<p><b>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</b></p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: MONUMENTO DE LA BIBLIA Y PARADOR FOTOGRAFICO LOS HATILLOS</p> <p>Año: 2022-2022</p> <p>Lugar: LOS HATILLOS PROVINCIA HATO MAYOR DEL REY</p> <p>Contratante: AYUNTAMIENTO DE GUAYABO DULCE</p> <p>Principales características del proyecto: PROYECTO URBANO TIPO MONUMENTAL, PARADA DE AUTOBUSES Y PARADOR FOTOGRAFICO.</p> <p>Actividades desempeñadas: ARQUITECTO CONTRATISTA Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO.</p>
--	--

**13. Certificación:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado

  
\_\_\_\_\_. Fecha: 18 de enero del /2023

Nombre completo de representante autorizado: MOISES MIGUEL AVILA MEJIA



# Moisés Avila

arq.moisesavila@gmail.com



Cédula: 027-0045921-3  
CODIA: 31624  
RPE:52632  
RNC:02700459213  
Tel: 829-638-3845  
Hato Mayor, RD

## Formación académica

2009-2013	Arquitecto Manejo de Autocad / Sketchup / Archicad / Lumion	Universidad Central del Este UCE
2014-2015	Habilitación Docente	Universidad Adventista Dominicana UNAD
2018	Curso de Facilitador de la Formación Profesional de la Formación Profesional 130 horas	INFOTEP

## Experiencia Profesional

2010-2013	Instructor de Inglés	Colegio Mis Primeros Pasos
2010-2013	Instructor de Informática Word / Excel / Power Point	CCI Hato Mayor
2009-2015	Monitor de Educación Artística (sin nombrar)	Centro Educativo Santa María del Batey
2015-Actual	Monitor de Arte Mención Multimedia Música / Coros / Diseño Gráfico	Centro Modalidad de Artes El Buen Samaritano
Actual	Arquitecto Independiente Diseños/ Presupuestos / Construcciones / Remodelaciones	MAGEZER DISEÑO Y CONSTRUCCION

## Referencias Personales

Arq. Omar Ramírez: 809-881-4477



Rev. P. Vicente Sánchez Burgos, Subdirector de Comunicación y Prensa, Arquidiócesis de Sto. Dgo. 849-268-8699

Lic. Nilsia Reyes Bastardo : Encargada R.R. H.H. / CENTRO UASD HATO MAYOR 809-395-0847

# Anexos



# Actividad Docente

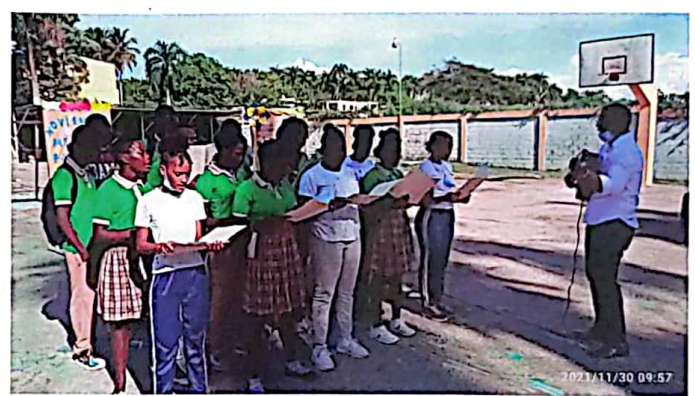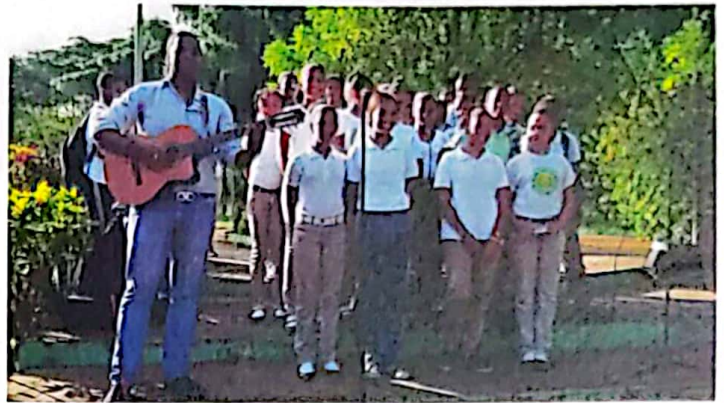





# Actividad en la Construcción



CENTRO ODONTOLÓGICO CEDENSA (EN CONSTRUCCIÓN ACTUAL)

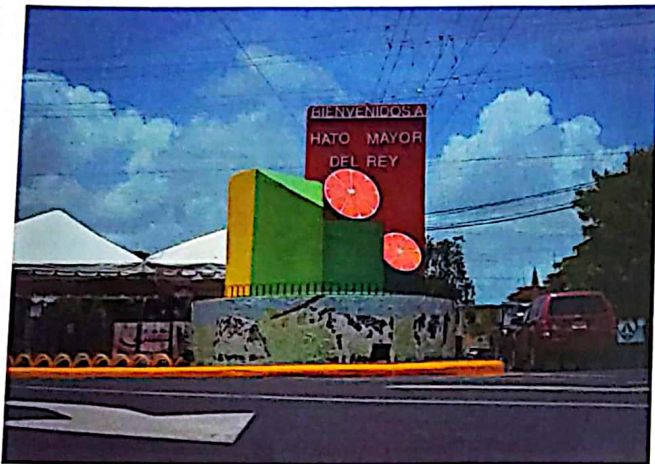

ROTONDA HATO MAYOR

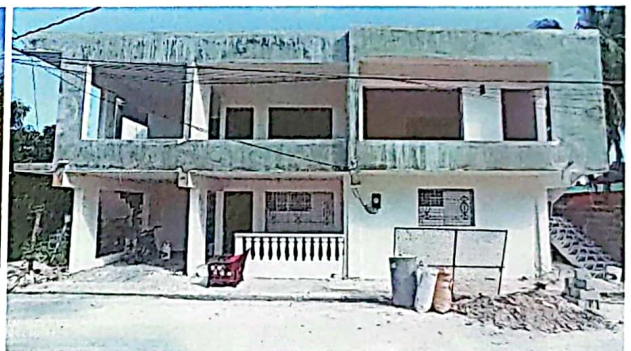

VIVIENDAS FAMILIARES





DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MONUMENTO A LA BIBLIA Y  
PARADOR FOTOGRÁFICO LOS HATILLOS (EN CONSTRUCCIÓN)



(DISEÑO) REMODELACIÓN FACHADA  
HOGAR DE ANCIANOS ROMELIA SALAS DE BARCELÓ



(DISEÑO) REMODELACIÓN FACHADA  
COLEGIO MEDICO DOMINICANO, FILIAL HATO MAYOR





DISEÑO MULTIUSO EN ZONA NORTE (HATO MAYOR)  
BAJO LA DIRECCIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL



DISEÑOS DE VIVIENDAS Y APARTAMENTOS EN PROCESO



# Universidad Central del Este

Fundada el 12 de Octubre de 1972  
SAN PEDRO DE MACORIS REPUBLICA DOMINICANA

El Consejo Universitario en virtud de las disposiciones legales vigentes:

Por cuanto: *Moisés Miguel Ávila Mejía*

ha cursado en la

*Facultad de Ciencias de las Ingenierías y Recursos Naturales*  
de esta Universidad los estudios requeridos y ha sido aprobado en los exámenes correspondientes.

Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el título de

**Arquitecto**

Y para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma, firmado y sellado en San Pedro de Macorís, República Dominicana, hoy día 22 de Febrero del año 2013

*Lic. Piedad Lucelott Noboa Mejía*  
El Secretario de la Universidad

*Dr. José Ramón Frappier*  
EL RECTOR

REGISTRADO BAJO EL NO. 41011 FOLIO 912  
DEL LIBRO DE GRADOS Y TITULOS





# Certificado de Aptitud Profesional Docente

Otorgado a:

**MOISES MIGUEL AVILA MEJIA**

Por haber aprobado satisfactoriamente las pruebas correspondientes, que  
le acredita como:

**FACILITADOR DE LA FORMACION  
PROFESIONAL**

Con una duración de 130 horas

Impartido en ESCUELA TECNICO VOCACIONAL HATO MAYOR DEL  
REY

En virtud de lo establecido en la Resolución que rige la expedición  
de Títulos, Certificados y Constancias

Dado en La Romana República Dominicana

el día 23 del mes junio del año 2018

y registrado en el libro 96 folio 98 con el Número 2

Gerente Regional

Encargado de Registro,  
Estadísticas y Certificados

Para validar, visite:  
<http://www.infotep.gov.do>







# Certificado de Aptitud Profesional Docente

Otorgado a:

**MOISES MIGUEL AVILA MEJIA**

Por haber aprobado satisfactoriamente las pruebas correspondientes, que  
le acredita como:

**FACILITADOR DE LA FORMACION  
PROFESIONAL**

Con una duración de 130 horas

Impartido en ESCUELA TECNICO VOCACIONAL HATO MAYOR DEL  
REY

En virtud de lo establecido en la Resolución que rige la expedición  
de Títulos, Certificados y Constancias

Dado en La Romana República Dominicana

el día 23 del mes junio del año 2018

y registrado en el libro 96 folio 98 con el Número 2

Gerente Regional

Encargado de Registro,  
Estadísticas y Certificados

Para validar, visite:  
<http://www.infotep.gov.do>





# TÍTULO DE MANEJO DE OFFICE

**CCI-HATO MAYOR**

*Centro de Capacitación en Informática  
Sala de Internet y Biblioteca Virtual*  
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

*Otorga el presente*

**DIPLOMA**

A: Moisés Miguel Ávila Mejía

*Lo que le acredita el grado de técnico(a) en computadora.*

Dado en la ciudad de Hato Mayor del Rey, República Dominicana  
a los 12 días del mes de mayo del año 2007

*Padre Vicente Sánchez B.*

Padre Vicente Sánchez B.  
Director



*Ing. Miguel A. Santana C.*  
Ing. Miguel Antonio Santana C  
Profesor

# OTROS CURSOS REALIZADOS



Universidad Central del Este  
Vicerrectoría de Proyectos Interinstitucionales e Innovación  
Dirección de Educación Continuada

OTORGA EL PRESENTE

## DIPLOMA

*Moisés Ávila Mejía*

\_\_\_\_\_  
POR HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DEL

DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN MUSICAL I PARA LA  
ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EN LOS NIVELES BÁSICO Y MEDIO

ACREDITACIÓN: 80 HORAS  
DADO EN SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM., A LOS 26 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014.


  
LIC. JOSÉ ALTA GRACIA HAZIM TORRES  
RECTOR UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE



  
FRANCISCO INFANTE JAVIER  
COORDINADOR ACADÉMICO

AUSPICIADO POR:

  
inafocam  
Instituto Nacional de Formación  
y Capacitación en Agricultura



AUSPICIADO POR:



Universidad Central del Este  
Vicerrectoría de Proyectos Interinstitucionales e Innovación  
Dirección de Educación Continuada

OTORGA EL PRESENTE

# DIPLOMA

*Moisés Ávila Mejía*

\_\_\_\_\_  
POR HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DEL  
DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN MUSICAL II PARA LA  
ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EN LOS NIVELES BÁSICO Y MEDIO

ACREDITACIÓN: 80 HORAS  
DADO EN SAN PEDRO DE MACORIS, REP. DOM., A LOS 09 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.

  
LIC. JOSÉ ALTA GRACIA HAZIM TORRES  
RECTOR UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE



  
M. J. J. ACOSTA  
COORDINADOR ACADÉMICO



# TÍTULO DE HABILITACIÓN DOCENTE



**Universidad Adventista Dominicana**  
Vicerrectoría Académica

Certifica que:

Mtro. Miguel Ariza Mejía

Ha completado todas las requisitos del Diplomado en:

*Habilitación Docente.*

Dado en la Estación Santo Domingo, el día 1 del mes de febrero 2015

Dr. Federico Martínez Páez

Rector

Dr. M. R. Suro de Lina

Vicerrectora Académica

Dr. E. M. M. M.

Dir. Ejec. Maestría  
Dirección de Postgrado

República d.R. D.

Folio No. 110

Del libro de inscripción 1

Autopista Duarte KM 74 1/2 Villa Sonador, Piedra Blanca, R.D. 809-525-7533-36



18 de enero de 2023

Página 1 de 3

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR

## EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

## Currículum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

**Función Prevista en el Contrato: ARQUITECTO CONTRATISTA Y DIRECTOR DE OBRAS**

1. Apellidos: AVILA MEJIA
2. Nombre: MOISES MIGUEL
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 02/07/1990, HATO MAYOR REP. DOM.
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: CASADO
6. Formación: ARQUITECTO
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico:

C/PADRE MERIÑO # 105 B/ GALINDO, HATO MAYOR DEL REY.  
 EMAIL: [arq.moisesavila@mail.com](mailto:arq.moisesavila@mail.com) (829) 638-3845

Instituciones	Fecha De (mes/año) A (mes/año)	Titulación



8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna		X	X
INGLES	5		X	X
FRANCES	2		X	X

9. Afiliación a organismos profesionales: COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)

10. Función actual: MIEMBRO

11. Otras competencias. (informática, etc.):

INGLÉS, INFORMÁTICA, HABILITACION DOCENTE TECNICO EN FORMACION PROFECIONAL INFOTEP.

12. Años de experiencia profesional: 10 AÑOS

13. Cualificaciones Principales: ARQ. DISEÑO, CONSTRUCCIONES

14. Experiencia específica en países no industrializados:

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (mes/año) a (mes/año)				
DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2022	LOS HATILLOS PROVINCIA HATO MAYOR	AYUNTAMIENTO GUAYABO DULCE	Arq. Contratista	Diseño y construcción del parador fotográfico los Hatillos
DESDE MAYO DEL 2020 HASTA LA ACTUALIDAD	HATO MAYOR DEL REY	CENTRO DENTAL CEDENSA	Arq. Contratista	Diseño y construcción del centro odontológico cedensa SRL.

16. Varios.

- a. Publicaciones y Seminarios:
- b. Referencias:P
- c.

Firma:

Sello



# COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES

- CODIA -

DELEGACION HATO MAYOR DEL REY

Padre Meriño #18  
Hato Mayor del Rey, Rep. Dom.

Tel.: 809-553-3180  
Fax: 809-553-3180

AÑO DE LA INNOVACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CODIANA

## CERTIFICACION

Por medio de la presente, certificamos que el Arq. Moisés M. Ávila M. Codia 31624, Cédula de Identidad y Electoral No.027-0045921-3, Residente en Hato Mayor, es miembro de esta delegación, Hacemos contar que él está al día con el pago de sus cuotas y cuenta con nuestro mayor respeto y consideración.

Dado en Hato Mayor del Rey, a los 16 días del mes de Enero del año 2023.

Atentamente,

Arq. Edgar Hazim Amparo  
Codia 20494  
Presidente

Ing. Civil. Casclais Ant. Polanco  
Codia 16869  
Secretario General





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HATO MAYOR

18 de enero de 2023

## PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

Señores:

Página 1 de 1

Comité De Compras y Contrataciones.  
Ayuntamiento Municipal Hato Mayor del Rey

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra para el proceso AMHMR-CCC-CP-2023-0001 de esa Institución.

- i- Total de personal
    - a. Personal de dirección y gestión (3)
    - b. Personal administrativo (4)
    - c. Personal técnico
      - Ingenieros (4)
      - Geómetras (1)
      - Capataces (3)
      - Mecánicos (2)
      - Técnicos (2)
      - Operadores de maquinaria (2)
      - Conductores (6)
      - Otros especialistas (2)
      - Obreros y manos de obra no cualificada (35)
- 
- Total (64)**
- ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)
    - a. Gestión de obra
    - b. Personal administrativo
    - c. Personal técnico
      - Ingenieros
      - Geómetras
      - Capataces
      - Mecánicos
      - Técnicos
      - Operadores de maquinaria
      - Conductores
      - Otros especialistas
      - Obreros y manos de obra no cualificada
- 

Total

Firma

Sello



## DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

El proyecto consiste en la construcción y rehabilitación de aceras, contenes, imbornales y badenes en la provincia de Hato Mayor del Rey, dentro del plan de desarrollo de la provincia desarrollado por la alcaldía Municipal de Hato Mayor del Rey, el proyecto cumple con las condiciones de accesibilidad universal establecida en el reglamento M-007 y los reglamentos del MOPC el reglamento para diseño y construcción de estructuras en Hormigón Armado (R-033).

Con la ejecución de los trabajos que contemplan la propuesta de este proceso se pretende dar con esta iniciativa atacar el estado ausente y en deterioro de la infraestructura del cabildo como a su vez dar en mantenimiento pertinente de las mismas y embellecer el entorno del mismo y brindar una mejor calidad de vida a los muncípes, dentro de las principales actividades del proceso se pueden mencionar la construcción y reconstrucción de aceras y contenes en distintas localidades del municipio donde se usaran materiales de excelente calidad como es el concreto u hormigón industrial con resistencia a la rotura de 180 kg/cm<sup>2</sup> donde en los contenes se les dará una terminación pulida y homogénea y en las aceras se les brindara una terminación Tablillas Rojas y Gris en Aceras (Adoquines) y Derretido Gris Meniccuchi en Aceras en Tablillas Rojas y Gris (Adoquines) y el vaciado de aceras en Hormigón para su posterior estampado y colocación de sealer de protección, también se usara material de relleno extraído directamente de mina como el telford que aplica en el caso de los contenes y caliche para las aceras, ambos serán nivelados con asistencia topográfica y compactados con un compactador manual.

El esquema constructivo principal para seguir sería la demolición de aceras y contenes en mal estado, el replanteo y confección del molde o encofrados en madera para los contenes y luego el vaciado de hormigón industrial en contenes y posteriormente se procede al relleno y compactación del área de aceras colocándose aceras con la colocación de las tablillas Rojas y Gris, y el vaciado de contenes, entre otras actividades secundarias.

Destacando paso a paso de las actividades que componen el proceso se pueden mencionar de la siguiente manera: demolición de aceras y contenes en mal estado, replanteo de los contenes llegando un control de niveles con asistencia topográficas, excavación para los contenes, relleno de telford en contenes, encofrado o confección de moldes para contenes, colocación de hormigón industrial para confección de contenes, relleno con caliche en aceras, colocación de las tablillas rojas y gris, donde también tendremos vaciado de aceras en Hormigón para su posterior estampado y colocación de sealer de protección confesión de Jardineras en block y revestidas en piedra con su vegetación en palmas Alexandra y grama, donde también se procederá a la instalación de luminarias en el lote que lo amerite bote de escombros y material no clasificado y limpieza final.

Como producto final se pretende obtener un contén con la plantilla predefinida por la entidad contratante con terminación pulida, con una pendiente estandarizada para que las aguas puedan drenarse de forma correcta y evitar estancamientos de estas y buena resistencia al uso cotidiano, así también aceras con un espesor estándar de 10cm con terminación estampada y de color rojo y también aceras con una terminación adoquinada con tablillas de color rojo y gris. El tiempo en ejecución puede variar en razón a condiciones exógenas a la ejecución de los trabajos siempre respetando las disposiciones de duración de trabajo establecidas en el pliego de condiciones del proceso por la entidad contratante, habiendo mencionado eso, en promedio, se construirán 80 metros lineales y contenes diarios y por igual 80 metros cuadrados de aceras días, tomando en cuenta que la construcción de aceras y contenes se harían en días distintos.

Para ejecutar los trabajos en los tiempos propuestos en el cronograma de actividades suministrados se debe contar con el personal técnico de obra capacitado, la brigada de trabajo estará compuesta por el director del proyecto, un ingeniero residente, un agrimensor, un capataz, tres albañiles, dos carpinteros y seis auxiliares de obra o ayudantes.

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN  
Original 1 - Expediente de Compras





En resumen, General

#### Los contenes

El proyecto trata de construcción de contenes, remodelación de contenes ya existente en mal estado, de nuevos badenes, reparación de badenes ya existente, construcción de aceras, y reparación de aceras en mal estado en distintas áreas, construcción de imbornales y reparación de lo mismo que este en mal estado y limpieza en dados casos.


Las estructuras estarán formadas por acera en hormigón estampadas rojo y aceras adoquinadas con tablillas en concreto de color rojo y gris, badenes en hormigón armado pulido, los imbornales están formado por una losa de fondo, muros de mampostería, división de cámaras y losa vaciada en la parte superior con tapa de imbornales para limpieza.

Las tareas por realizar, a los fines de alcanzar los niveles de calidad y precisión establecido en los documentos de la licitación, se detallan a continuación por grupos de partida:

Movimiento de tierra. Comprenden la actividad de cortes y relleno en el terreno para la construcción de los contenes, badenes, imbornales y las aceras. Previo a estas actividades se ha requerido el replanteo y nivelación para llevar las pendientes y los puntos, la verificación de los métodos de excavación y la clasificación de materiales en el sitio de la obra. Luego se requerirá la eliminación de material inservible; delimitación y retiro de capa vegetal en su totalidad colocación de relleno estructural hasta el nivel requerido, definición de lugares de almacenamiento o recolección. Comprende las excavaciones de contenes, imbornales, badenes previa verificación de los niveles fondos de excavaciones, a confirmar con la supervisión. Se deberá confirmar la condición de fondo de excavación con el organismo que la alcaldía disponga como supervisión del proyecto para recibir las fundaciones de las estructuras y monolíticos. Se procederá al bote de material inservible, para esta actividad se contemplan brigadas de movimiento de tierra (excavación, relleno y bote).

Hormigón armado. comprenden la construcción de elementos portante de la estructura, badenes, contenes, e imbornales, previa verificación de los niveles se procederá al encofrado para el colado de hormigón, desencofrado y curado. Se llevará el control de los materiales en los que se utilizan acero cumpliendo con las normas ASTM C 949, sin usar cloruro de calcio, en la preparación del encofrado utilizado como agregado máximo para concreto encofrado de ¾ pulgada, verificado dimensiones, elevaciones, y resistencia igualmente, se verificara la limpieza interior de los imbornales.

Para la mezcla se utilizará la norma ACI 301 antes de iniciar se debe aprobar los materiales y diseño de mezcla, realizar un lote de prueba, aprobación de la planta de producción del concreto y procedimiento de control de calidad como la toma de muestra de tres probetas por cada 7 m3 de hormigón, al igual que las pruebas de pavimento según lo establecido en las especificaciones técnicas.

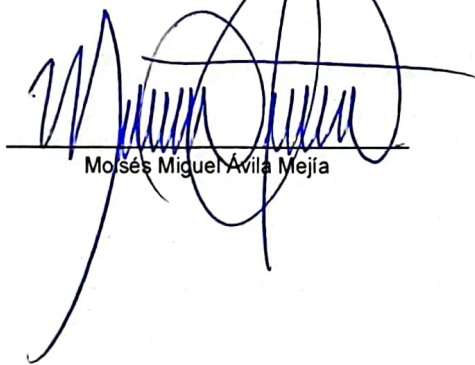

Moisés Miguel Ávila Mejía



## LIATADO DE PARTIDAD CON VOLUMETRÍA

**PRESUPUESTO ACTUALIZADO: La Jagua**

No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD
<b>I</b>	<b>TRABAJOS GENERALES</b>		
1.1	Ingeniería	KM	0.99
1.2	Mantenimiento de Transito	PA	1.00
1.3	Campamento	PA	1.00
<b>II</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>		
2.1	<b>Excavación de Material Inservible</b>		
	b) A mano	M3N	246.25
2.2	<b>Relleno</b>		
	c) Bajo Acera	M3C	440.79
2.3	<b>Acarreo Condicional (Bote) de 5km</b>		
	d) Material Inservible	M3E-HM	19,092.38
2.4	<b>Excavación para estructuras de hasta 1.50 de profundidad</b>	M3N	36.60
<b>III</b>	<b>ESTRUCTURAS Y PUENTES</b>		
3.1	<b>Hormigón Estructural</b>		
	Para Badenes Tipo A	M3	12.60
3.3	Aceras con malla electrosoldada, frotadas con escobillón y violinadas (h-0.10mt), hormigón Industrial f'c: 210kg/cm2, (D2.3XD2.3,15X15, rollo 2.40x40.0m)	M3	24.00
<b>IV</b>	<b>DRENAJES</b>		
4.1	Imbornales Tipo III hasta 1.50 m de profundidad (Incluye Excavación)	UD	4.00
<b>III</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
3.1	Bordillo y Cuneta de Hormigón Tipo C vaciado en Sitio	MTL	985.00
3.2	Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2).	MT2	985.00
3.5	Limpieza Final y Bote	PA	1.00

**PRESUPUESTO ACTUALIZADO: La Ceiba**

No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD
<b>I</b>	<b>TRABAJOS GENERALES</b>		
1.1	Ingeniería	KM	2.01
1.2	Mantenimiento de Transito	PA	1.00
1.3	Campamento	PA	1.00
<b>II</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>		
2.1	<b>Excavación de Material Inservible</b>		
	b) A mano	M3N	502.50
2.2	<b>Relleno</b>		
	c) Bajo Acera	M3C	899.48
2.3	<b>Acarreo Condicional (Bote) de 5km</b>		
	d) Material Inservible	M3E-HM	38,859.75
2.4	<b>Excavación para estructuras de hasta 1.50 de profundidad</b>	M3N	73.20
<b>III</b>	<b>ESTRUCTURAS Y PUENTES</b>		
3.1	<b>Hormigón Estructural</b>		
	Para Badenes Tipo A	M3	25.20
3.3	Aceras con malla electrosoldada, frotadas con escobillón y violinadas (h-0.10mt), hormigón Industrial f'c: 210kg/cm <sup>2</sup> , (D2.3XD2.3,15X15, rollo 2.40x40.0m)	M3	48.00
<b>IV</b>	<b>DRENAJES</b>		
4.1	Imbornales Tipo III hasta 1.50 m de profundidad (Incluye Excavación)	UD	8.00
<b>III</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
3.1	Bordillo y Cuneta de Hormigón Tipo C vaciado en Sitio	MTL	2,000.00
3.2	Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm <sup>2</sup> ).	MT2	2,000.00
3.5	Limpieza Final y Bote	PA	1.00



**PRESUPUESTO ACTUALIZADO: La Franja**

No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD
<b>I</b>	<b>TRABAJOS GENERALES</b>		
1.1	Ingeniería	KM	1.45
1.2	Mantenimiento de Transito	PA	1.00
1.3	Campamento	PA	1.00
<b>II</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>		
2.1	Excavación de Material Inservible		
	b) A mano	M3N	361.50
2.2	Relleno		
	c) Bajo Acera	M3C	647.09
2.3	Acarreo Condicional (Bote) de 5km		
	d) Material Inservible	M3E-HM	29,342.25
2.4	Excavación para estructuras de hasta 1.50 de profundidad	M3N	73.20
<b>III</b>	<b>ESTRUCTURAS Y PUENTES</b>		
3.1	Hormigón Estructural		
	Para Badenes Tipo A	M3	25.20
3.3	Aceras con malla electrosoldada, frotadas con escobillón y violinadas (h-0.10mt), hormigón Industrial fc: 210kg/cm <sup>2</sup> , (D2.3XD2.3,15X15, rollo 2.40x40.0m)	M3	48.00
<b>IV</b>	<b>DRENAJES</b>		
4.1	Imbornales Tipo III hasta 1.50 m de profundidad (Incluye Excavación)	UD	6.00
<b>III</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
3.1	Bordillo y Cuneta de Hormigón Tipo C vaciado en Sitio	MTL	1,446.00
3.2	Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm <sup>2</sup> ).	MT2	1,446.00
3.5	Limpieza Final y Bote	PA	1.00




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		<b>PROGRAMACIÓN LOTE 2 (SECTOR LA CEIBA)</b>				
2		<b>LOTE 2</b>	55 días	lun 9/1/23	mar 7/3/23	
3		<b>TRABAJOS GENERALES</b>	55 días	lun 9/1/23	mar 7/3/23	
4		Ingeniería	5 días	lun 9/1/23	vie 13/1/23	
5		Mantenimiento de Tránsito	5 días	lun 9/1/23	vie 13/1/23	
6		Campamento	3 días	lun 9/1/23	jue 12/1/23	4CC
7		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	3 días	lun 9/1/23	jue 12/1/23	5CC
8		Excavación de Material Inservible (A mano)	20 días	jue 12/1/23	mié 1/2/23	
9		Relleno Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera,(Incluye un 25% del mat. de relleno a reponer en la remoción de las aceras)	7 días	jue 12/1/23	jue 19/1/23	6
10		Acarreo Condicional (Bote) de 5km (Material Inservible)	4 días	jue 26/1/23	mar 31/1/23	9
11		Excavación para estructuras de hasta 1.50 de profundidad	2 días	mar 31/1/23	mié 1/2/23	10
12		<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS:</b>	32 días	jue 2/2/23	mar 7/3/23	
13		Para Badenes Tipo A	9 días	jue 2/2/23	vie 10/2/23	11
14		Aceras con malla electrosoldada, frotadas con escobillón y violinadas (h-0.10mt), hormigón Industrial f'c: 210kg/cm2, (D2.3XD2.3,15X15, rollo	7 días	sáb 11/2/23	sáb 18/2/23	13
15		Imbornales Tipo III hasta 1.50 m de profundidad (Incluye Excavación)	5 días	sáb 18/2/23	jue 23/2/23	14
16		Bordillo y Cuneta de Hormigón Tipo C vaciado en Sitio	7 días	jue 23/2/23	jue 2/3/23	15
17		Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2).	4 días	jue 2/3/23	mar 7/3/23	16
18		Limpieza Final y Bote	2 días			

solo duración  
 Informe de resumen manual  
 Resumen manual  
 solo el comienzo  
 solo fin  
 Fecha limite  
 Tarea crítica  
 Progreso

Hito resumido  
 Progreso resumido  
 Tareas externas  
 Hito externo  
 Tarea inactiva  
 Hito inactivo  
 Resumen inactivo  
 Tarea manual

Tarea  
 División  
 Hito  
 Resumen  
 Resumen del proyecto  
 Agrupar por síntesis  
 Tarea resumida  
 Tarea crítica resumida

Proyecto: Construcción-Recons  
 Fecha: mié 25/1/23

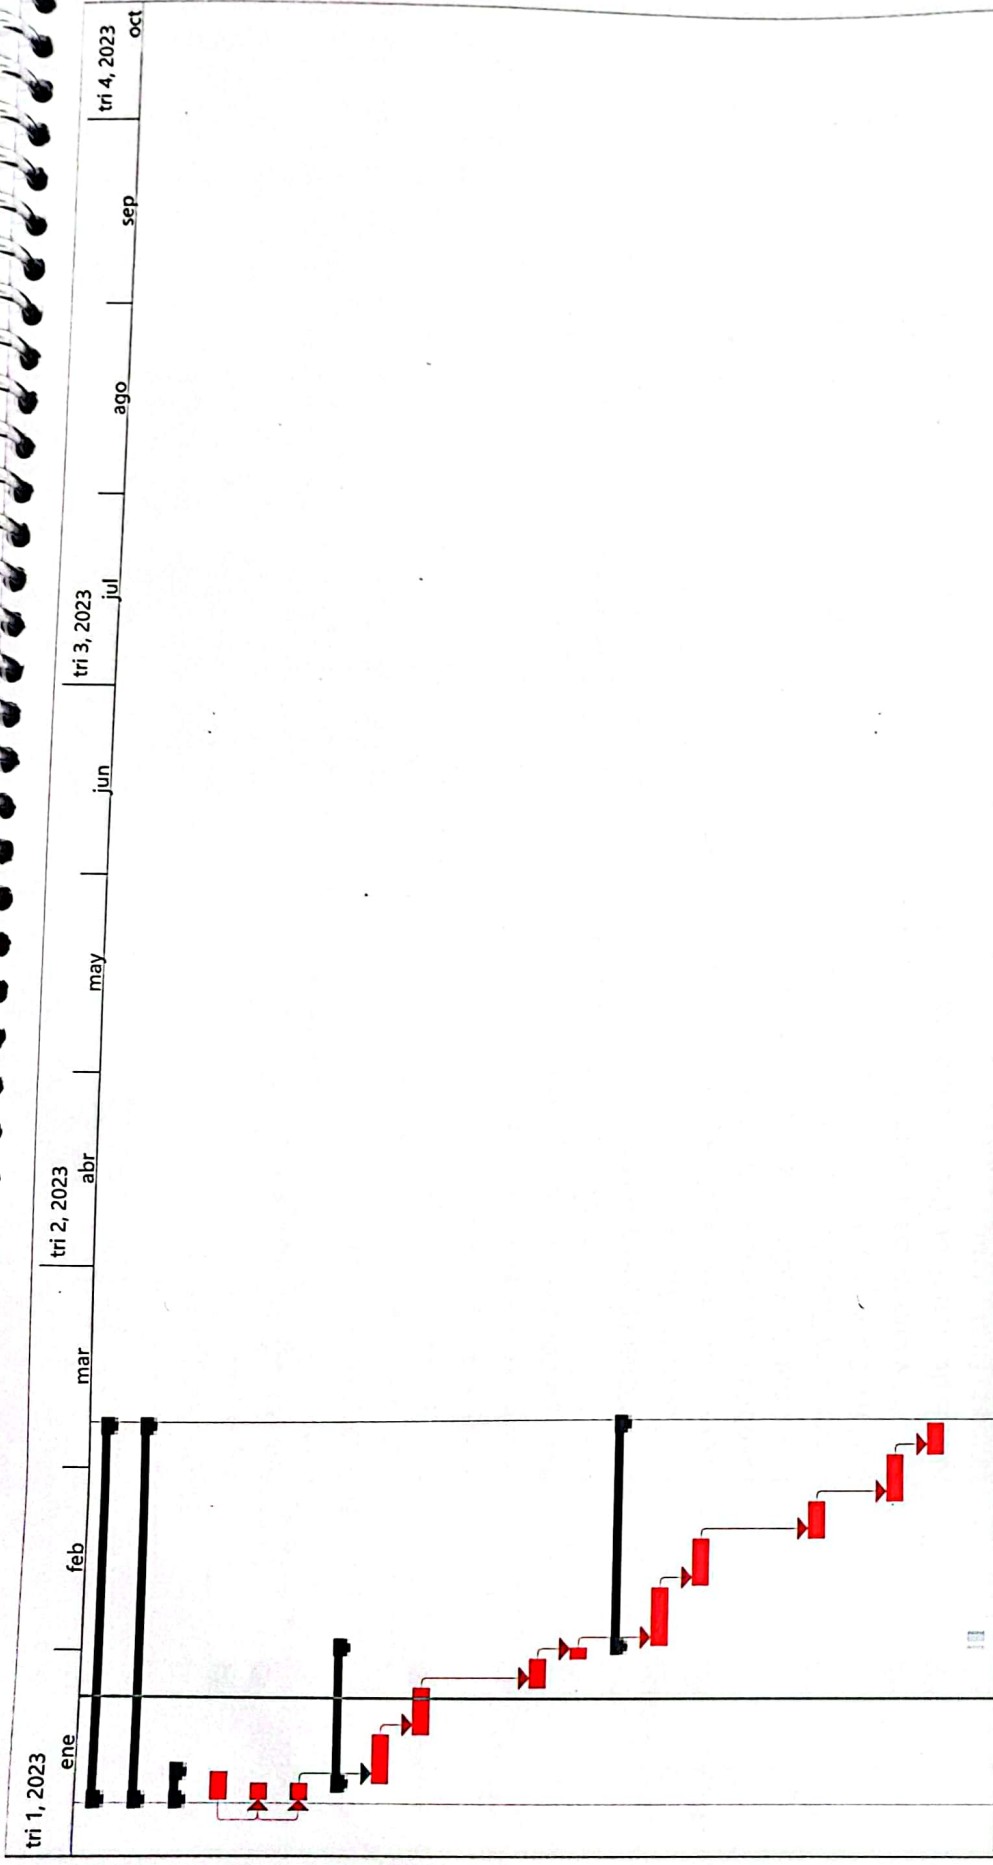

Tarea		Hito resumido		solo duración	
División		Progreso resumido		Informe de resumen manual	
Hito		Tareas externas		Resumen manual	
Resumen		Hito externo		solo el comienzo	
Resumen del proyecto		Tarea inactiva		solo fin	
Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Fecha límite	
Tarea resumida		Resumen inactivo		Tarea crítica	
Tarea crítica resumida		Tarea manual		Progreso	

Proyecto: Construcción-Recons  
 Fecha: mié 25/1/23




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		<b>PROGRAMACIÓN LOTE 1 (SECTOR LA JAGUA)</b>				
2		<b>LOTE 1</b>	55 días	lun 9/1/23	mar 7/3/23	
3		<b>TRABAJOS GENERALES</b>	55 días	lun 9/1/23	mar 7/3/23	
4		Ingeniería	5 días	lun 9/1/23	vie 13/1/23	
5		Mantenimiento de Transito	5 días	lun 9/1/23	vie 13/1/23	
6		Campamento	3 días	lun 9/1/23	jue 12/1/23	4CC
7			3 días	lun 9/1/23	jue 12/1/23	5CC
8		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	20 días	jue 12/1/23	mié 1/2/23	
9		Excavación de Material Inservible (A mano)	7 días	jue 12/1/23	jue 19/1/23	6
10		Relleno Suministro ,colocación y acarreo material de relleno a reponer en la remoción de las aceras)	7 días	jue 19/1/23	jue 26/1/23	8
11		Acarreo Condicional (Bote) de 5km (Material Inservible)	4 días	jue 26/1/23	mar 31/1/23	9
12		Excavación para estructuras de hasta 1.50 de profundidad	2 días	mar 31/1/23	mié 1/2/23	10
13		<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS:</b>	32 días	jue 2/2/23	mar 7/3/23	
14		Para Badenes Tipo A	9 días	jue 2/2/23	vie 10/2/23	11
15		Aceras con malla electrosoldada, frotadas con escobillón y violinadas (h-0.10mt), hormigón Industrial f'c: 210kg/cm2, (D2.3XD2.3,15X15, rollo Imbornales Tipo III hasta 1.50 m de profundidad (Incluye Excavación)	7 días	sáb 11/2/23	sáb 18/2/23	13
16		Bordillo y Cuneta de Hormigón Tipo C vaciado en Sitio	5 días	sáb 18/2/23	jue 23/2/23	14
17		Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2).	7 días	jue 23/2/23	jue 2/3/23	15
18		Limpieza Final y Bote	4 días	jue 2/3/23	mar 7/3/23	16
			2 días			

Tarea	Hito resumido	Hito resumido	solo duración
División	.....	.....	Informe de resumen manual
Hito	■	■	Resumen manual
Resumen	■	■	solo el comienzo
Resumen del proyecto	■	■	solo fin
Agrupar por síntesis	■	■	Fecha limite
Tarea resumida	■	■	Tarea critica
Tarea crítica resumida	■	■	Progreso

Proyecto: Construcción-Recons  
Fecha: mié 25/1/23



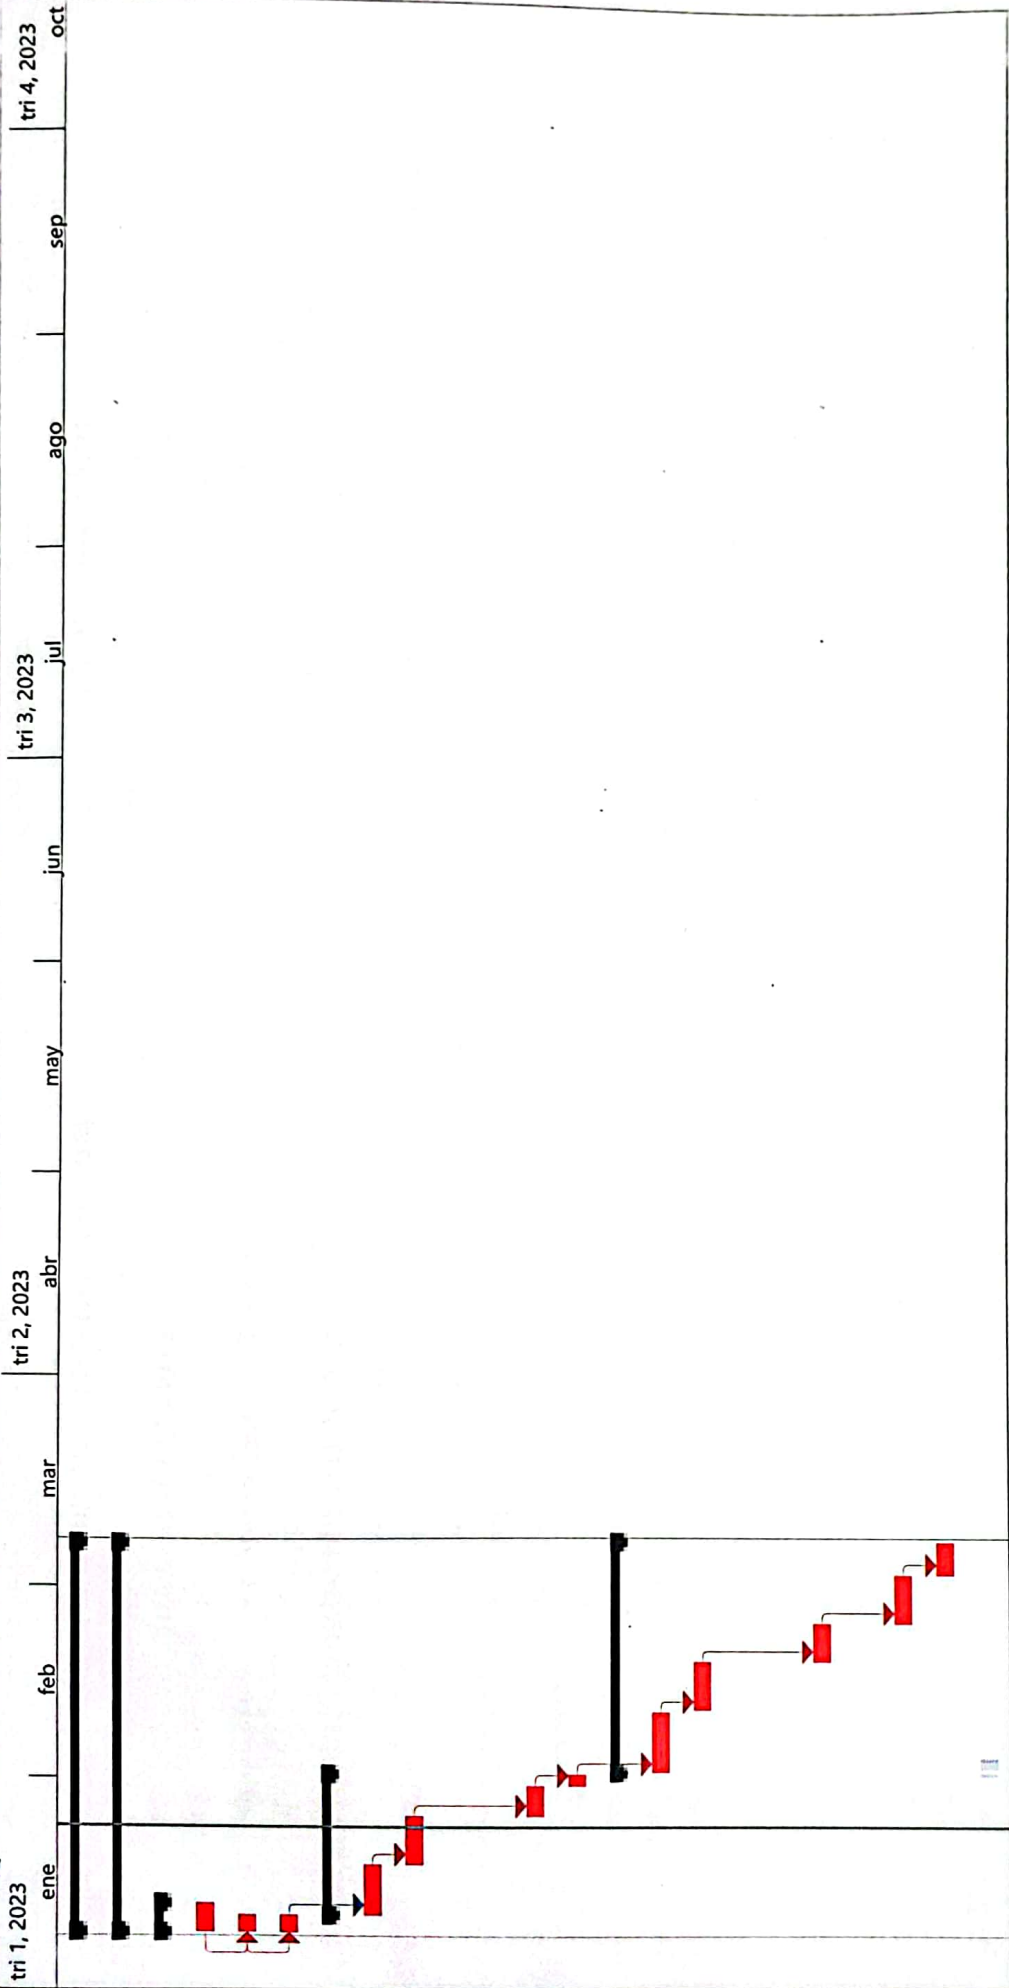

Tarea		Hito resumido		solo duración	
División		Progreso resumido		Informe de resumen manual	
Hito		Tareas externas		Resumen manual	
Resumen		Hito externo		solo el comienzo	
Resumen del proyecto		Tarea inactiva		solo fin	
Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Fecha límite	
Tarea resumida		Resumen inactivo		Tarea crítica	
Tarea crítica resumida		Tarea manual		Progreso	


Proyecto: Construcción-Recons  
 Fecha: mié 25/1/23

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	dic
1		PROGRAMACIÓN LOTE 4 (SECTOR LA FRANJA)	55 días	lun 9/1/23	mar 7/3/23		
2		LOTE 4	55 días	lun 9/1/23	mar 7/3/23		
3		TRABAJOS GENERALES	5 días	lun 9/1/23	vie 13/1/23		
4		Ingeniería	5 días	lun 9/1/23	vie 13/1/23		
5		Mantenimiento de Transito	3 días	lun 9/1/23	jue 12/1/23	4CC	
6		Campamento	3 días	lun 9/1/23	jue 12/1/23	5CC	
7		MOVIMIENTO DE TIERRA:	20 días	jue 12/1/23	mié 1/2/23		
8		Excavación de Material Inservible (A mano)	7 días	jue 12/1/23	jue 19/1/23	6	
9		Relleno Suministro , colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera,(Incluye un 25% del mat. de relleno a reponer en la remoción de las aceras)	7 días	jue 19/1/23	jue 26/1/23	8	
10		Acarreo Condicional (Bote) de 5km (Material Inservible)	4 días	jue 26/1/23	mar 31/1/23	9	
11		Excavación para estructuras de hasta 1.50 de profundidad	2 días	mar 31/1/23	mié 1/2/23	10	
12		OBRAS COMPLEMENTARIAS:	32 días	jue 2/2/23	mar 7/3/23		
13		Para Badenes Tipo A	9 días	jue 2/2/23	vie 10/2/23	11	
14		Aceras con malla electrosoldada, frotadas con escobillón y violinadas (h-0.10mt), hormigón Industrial f'c: 210kg/cm2, (D2.3XD2.3,15X15, rollo	7 días	sáb 11/2/23	sáb 18/2/23	13	
15		Imbornales Tipo III hasta 1.50 m de profundidad (Incluye Excavación)	5 días	sáb 18/2/23	jue 23/2/23	14	
16		Bordillo y Cuneta de Hormigón Tipo C vaciado en Sitio	7 días	jue 23/2/23	jue 2/3/23	15	
17		Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2).	4 días	jue 2/3/23	mar 7/3/23	16	
18		Limpieza Final y Bote	2 días				

**Tarea**: Hito resumido  
**División**: Progreso resumido  
**Hito**: Tareas externas  
**Resumen**: Hito externo  
**Resumen del proyecto**: Tarea inactiva  
**Agrupar por síntesis**: Hito inactivo  
**Tarea resumida**: Resumen inactivo  
**Tarea crítica resumida**: Tarea manual

**Proyecto: Construcción-Recons**  
**Fecha: mié 25/1/23**

**Legend for task types:**  
 solo duración  
 Informe de resumen manual  
 Resumen manual  
 solo el comienzo  
 solo fin  
 Fecha limite  
 Tarea crítica  
 Progreso

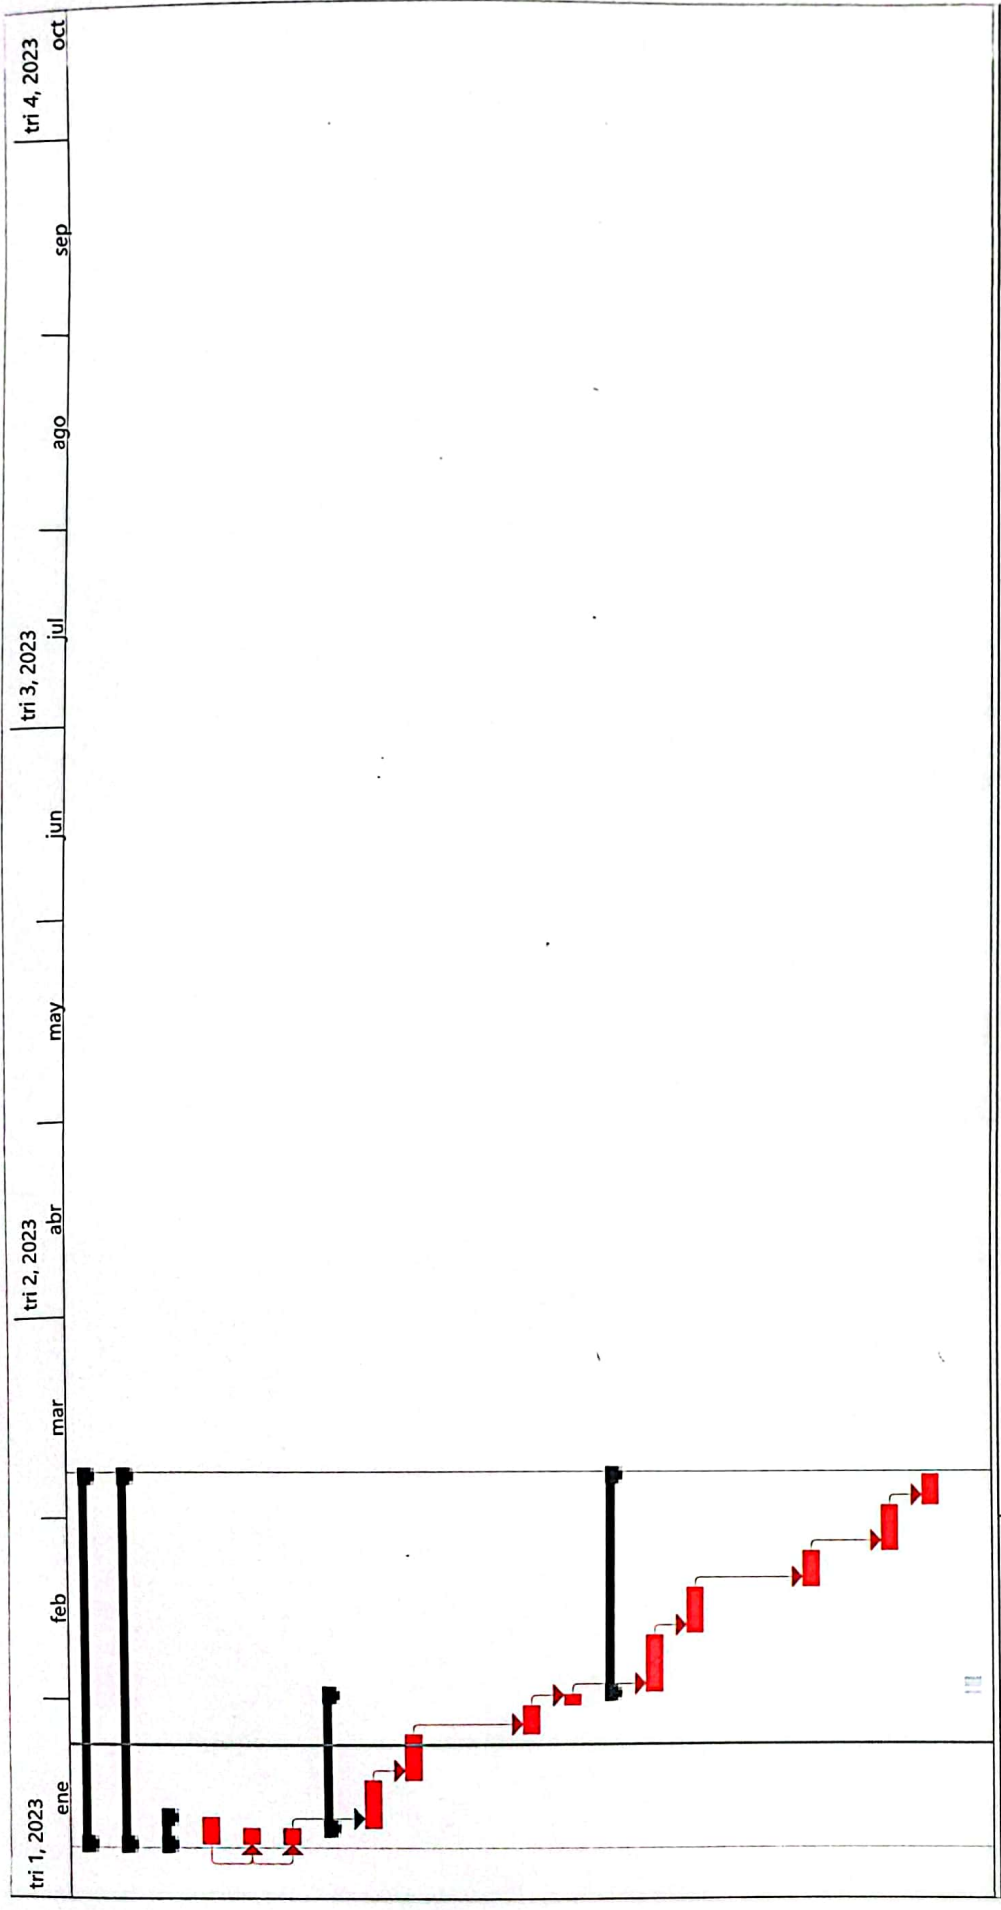


Tarea		Hito resumido		solo duración	
División		Progreso resumido		Informe de resumen manual	
Hito		Tareas externas		Resumen manual	
Resumen		Hito externo		solo el comienzo	
Resumen del proyecto		Tarea inactiva		solo fin	
Agrupar por síntesis		Hito inactivo		Fecha límite	
Tarea resumida		Resumen inactivo		Tarea crítica	
Tarea crítica resumida		Tarea manual		Progreso	

Proyecto: Construcción-Recons  
 Fecha: mié 25/1/23



**COLEGIO DOMINICANO  
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS  
Y AGDIMENSORES (CODIA)**

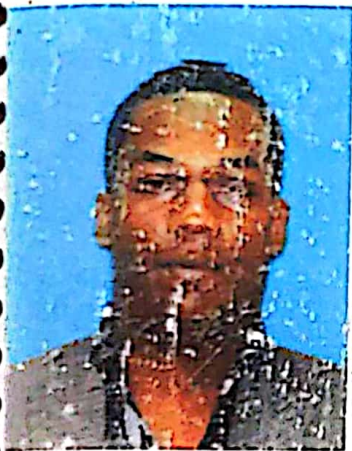

**APELLIDOS:**

**Avila Mejía**

**NOMBRES:**

**Moises**

**PROFESION:**

**Arquitecto**

**EXEQUATUR 481**

**D/F: 12/12/201**

**CEDULA: 027-0045921-3**

**COLEGIATURA: 31624**

Firma colegiado

Firma Presidente



## CARTA DE INTERES Y DISPONIBILIDAD

18 de enero de 2023

Señores  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY**

Referencia: Procedimientos No: AMHMR-CCC-CP- 2023-0001

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para el Procedimiento de referencia, incluyendo las adendas realizadas a los mismos.
- b) **De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a ejecutar las obras del lote que resultara ganador, provincias en la que me encuentro inscrito en calidad de oferente como persona física o jurídica en el presente procedimiento.**
- c) Si resultamos adjudicados en la obra, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **UNO POR CIENTO (1%)** si presentamos la Certificación del Ministerio de Industria y Comercio que nos clasifique como MIPYME) del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- d) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Contratante para presentar ofertas.
- e) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

MOISES MIGUEL AVILA MEJIA en calidad de Oferente.

Firma

Sello
